



Mastère 2 Cybersécurité - Année 2025-2026

Projet de groupe

Cyber Trust

RENDU INDIVIDUEL

Kilyan FELIX

Chef de projet

Établissement	Sup de Vinci - Mastère 2 Cybersécurité
Type de rendu	Rendu individuel
Auteur	Kilyan FELIX - Chef de projet
Équipe	K. FELIX · Y. FOCSA · Y. GUERNIOU · M. DIACOUMBA
Nom de l'équipe	Cyber Trust
Date de rendu	26/06/2026
Version	1.0

Sommaire

1. Introduction	3
2. Présentation du projet et périmètre	3
3. Mon rôle et mes missions	3
4. Travail réalisé	4
4.1. Cadrage et méthode de pilotage	4
4.2. Suivi des livrables, des preuves et de la recette	5
4.3. Scénarios de détection et criticité	6
4.4. Conception des dashboards et du reporting	8
4.5. Pilotage de la vidéo et gestion des risques	8
5. Analyse critique des limites techniques	9
6. Perspectives d'évolution	10
7. Conclusion	10
Annexe A : Documentation utilisateur	10
Annexe B : Analyse personnelle	11

1. Introduction :

Ce rendu individuel présente la mise en place d'un SOC externalisé pour Daylight, un réseau multi-sites manipulant des données sensibles. Au sein de l'équipe Cyber Trust, j'ai occupé le rôle de chef de projet SOC. Après une présentation du projet et de son périmètre, je détaille mon rôle et mes missions, puis le travail réalisé. J'expose ensuite une analyse critique des limites techniques rencontrées et les perspectives d'évolution de la solution, avant de conclure. Les annexes regroupent la documentation utilisateur et mon analyse personnelle.

2. Présentation du projet et périmètre :

Le projet consiste à concevoir un SOC externalisé pour Daylight, un réseau multi-sites. La solution repose sur un SIEM open-source, Wazuh, qui collecte les journaux des postes, du réseau et des applications métier, les centralise, déclenche des alertes sur les comportements suspects et s'appuie sur des playbooks de réponse. L'objectif n'est pas une plateforme complète en production, mais un démonstrateur opérationnel, prouvé, documenté et industrialisable.

Daylight est un client multisite avec des données sensibles. L'entreprise n'a pas vocation à lire des logs bruts tous les jours. Elle attend de Cyber Trust :

- Une vision claire des alertes importantes ;
- Une priorisation ;
- Des dashboards lisibles ;
- Des procédures de réponse ;
- Un reporting qui permet de piloter le service.

Le périmètre du projet est volontairement délimité. Sont inclus : la collecte multi-source (endpoint, firewall/syslog, application métier), un SIEM centralisé avec dashboards et gestion des rôles, des règles de détection avec alertes et playbooks, et la simulation de scénarios d'attaque. En revanche, le projet ne comprend pas le développement d'un EDR maison, une mise en production réelle sur l'ensemble des sites, ni l'ajout d'outils superflus qui feraient perdre l'objectif du MVP.

3. Mon rôle et mes missions :

Le rôle de chef de projet SOC consiste à éviter deux risques :

1. livrer un dossier trop technique, illisible pour le client ;
2. livrer une démonstration séduisante mais sans réelle logique opérationnelle.

Mon travail consiste à relier les exigences, les livrables, les preuves et le discours.

Concrètement, mes missions ont été les suivantes :

- Cadrer le besoin client et reformuler les enjeux métier ;
- Construire et maintenir la matrice exigences → preuves ;
- Tenir le backlog, le planning et le suivi des bloqueurs ;
- Réaliser le chiffrage et le tableau de coûts ;
- Assembler le rapport de groupe et en vérifier la cohérence ;
- Piloter la vidéo : script, minutage, intervenants, cohérence ;
- Vérifier que chaque membre fournit ses preuves et annexes.

Organisation de l'équipe Cyber Trust :

Membre	Rôle retenu	Contribution principale
Yvan FOCSA	Architecte solution	Architecture, segmentation, pfSense, flux, trajectoire cible
Youssef GUERNIOU	Ingénieur SIEM Wazuh	Déploiement, agents, règles, dashboards Wazuh, RBAC
Kilyan FELIX	Chef de projet SOC	Pilotage, qualification, dashboards, planning, vidéo
Mahamadou DIACOUMBA	Exploitation lab / playbooks	VM, relance lab, procédures, playbooks, REX incidents

4. Travail réalisé :

En tant que chef de projet, ma contribution n'a pas porté sur la production technique : déploiement de Wazuh, écriture des règles de détection et configuration réseau, assurés respectivement par Youssef, Mahamadou et Yvan : mais sur le cadrage, la coordination, la qualification du besoin et la consolidation des livrables et des preuves. L'objectif de ma partie est de faire le lien entre la technique et la décision : répondre à la question « qu'est-ce que Daylight peut faire concrètement avec les alertes ? »

4.1. Cadrage et méthode de pilotage :

J'ai cadré le projet à partir du cahier des charges, en reformulant le besoin de Daylight et les enjeux métier, puis en répartissant les rôles au sein de l'équipe. J'ai retenu une méthode de pilotage hybride : cadrage initial, backlog de livrables, construction technique par lots, validation par preuves, consolidation finale (PDF/ZIP) et préparation de la vidéo. J'ai également réalisé le chiffrage de la solution et produit le tableau de coûts, en mettant en avant l'absence de coût de licence (Wazuh open-source) et la mutualisation du coût de run sur l'ensemble des sites.

Tableau de couts : SOC Externalisé :

Tableau de coûts : SOC externalisé

Coûts de mise en place (one-shot)			
Poste	Hypothèse	Min (€)	Max (€)
Licence SIEM (Wazuh open-source)	open-source	0 €	0 €
Serveur / VM SOC central	Cloud ou on-prem	1 500 €	3 000 €
Déploiement & configuration plateforme	~5 j/h	2 500 €	4 000 €
Déploiement agents + collecte (pilotes)	~3 j/h	1 500 €	2 500 €
Total mise en place		5 500 €	9 500 €

Coûts récurrents (annuels)			
Poste	Hypothèse	Min (€/an)	Max (€/an)
Hébergement infra SOC	VM / cloud	1 800 €	3 600 €
Stockage / rétention des logs	Volume 30 sites	1 200 €	3 000 €
Connectivité VPN site vers SOC	30 sites	1 000 €	2 000 €
Run SOC (supervision + analyse N1/N2)	Poste principal	25 000 €	45 000 €
Maintenance / MAJ / support		3 000 €	6 000 €
Total récurrent annuel		32 000 €	59 600 €

Coût marginal : onboarding d'un nouveau centre			
Poste	Hypothèse	Min (€)	Max (€)
Déploiement agent + intégration collecte	par site	150 €	300 €

Synthèse		
Indicateur	Min	Max
Investissement initial (one-shot)	5 500 €	9 500 €
Coût de fonctionnement annuel	32 000 €	59 600 €
Nombre de points de vente	30	
Coût annuel mutualisé par site	1 067 €	1 987 €
Coût marginal d'un nouveau centre	150 €	300 €

Cellules bleues = hypothèses modifiables. Fourchettes indicatives à ajuster selon vos choix réels (cloud / on-prem, charge j/h, volumétrie, run interne ou prestataire).

4.2. Suivi des livrables, des preuves et de la recette :

Pour piloter l'avancement et garantir que chaque tâche soit réellement aboutie, j'ai suivi les livrables du projet sous Jira. Chaque lot a été matérialisé par un ticket, avec son responsable (personne assignée) et son état (Terminé / En cours), ce qui donne une vision claire et à jour de la progression. On peut voir ici l'état des huit lots : sept sont terminés, seul l'enregistrement de la vidéo reste en cours.

Backlog de CyberTrust du projet sous Jira:

☐	Type	Résumé	État	Personne assignée
☐	☒	Lire cahier des charges	TERMINÉ	T tous
☐	☒	Définir architecture	TERMINÉ	Y Yvan
☐	☒	Déployer Wazuh	TERMINÉ	Y Youssef
☐	☒	Intégrer alertes	TERMINÉ	Y Youssef
☐	☒	Formaliser dashboards	TERMINÉ	KF Kilyan Felix
☐	☒	Rédiger playbooks	TERMINÉ	M mahamadou
☐	☒	Préparer vidéo	EN COURS	KF Kilyan Felix
☐	☒	Générer rendu 5 PDF	TERMINÉ	T tous
+ Créer				

4.3. Scénarios de détection et criticité :

Sur le volet détection, les règles Wazuh ont été implémentées par Youssef et Mahamadou. Ma contribution a consisté à les prioriser selon leur impact métier et à définir leur criticité, afin de transformer un ensemble d'alertes en priorités exploitables pour l'analyste.

J'ai d'abord sélectionné les scénarios qui ont réellement du sens pour Daylight, plutôt que des alertes génériques, en les rattachant chacun à une règle Wazuh et à un niveau de criticité. Pour formaliser cette priorisation, j'ai positionné les scénarios sur une matrice impact x urgence l'impact métier en ordonnée, l'urgence de réaction en abscisse. Cette représentation fait ressortir les scénarios à traiter en priorité (zone rouge, en haut à droite), comme l'accès anormal à un dossier patient ou la modification d'un groupe privilégié, et distingue les alertes de simple surveillance, comme le scan WAN bloqué.

J'ai ensuite traduit ce positionnement en une matrice de criticité associant à chaque niveau un délai de triage et une décision (escalade, surveillance, faux positif), afin que chaque alerte soit directement actionnable.

Matrice impact x urgence des scénarios de détection :

Matrice impact x urgence — scénarios de détection Daylight



Matrice de criticité SOC :

CRITIQUE

Triage sous 15 min

Critères : Données patients, privilège, mouvement latéral, exfiltration

Décision : Escalade immédiate

HAUTE

Triage sous 30 min

Critères : Attaque active ou compromission possible

Décision : Qualification prioritaire

MOYENNE

Triage sous 4 h

Critères : Suspicion à contextualiser

Décision : Analyse et suivi

BASSE

Triage à J+1


Critères : Hygiène ou information

Décision : Amélioration continue

4.4. Conception des dashboards et du reporting


J'ai défini la logique de conception des deux tableaux de bord, pensés pour deux publics distincts. Le dashboard technique destiné aux analystes SOC, permet d'investiguer rapidement (top règles, sévérité, timeline, sources).

Dashboard Technique :

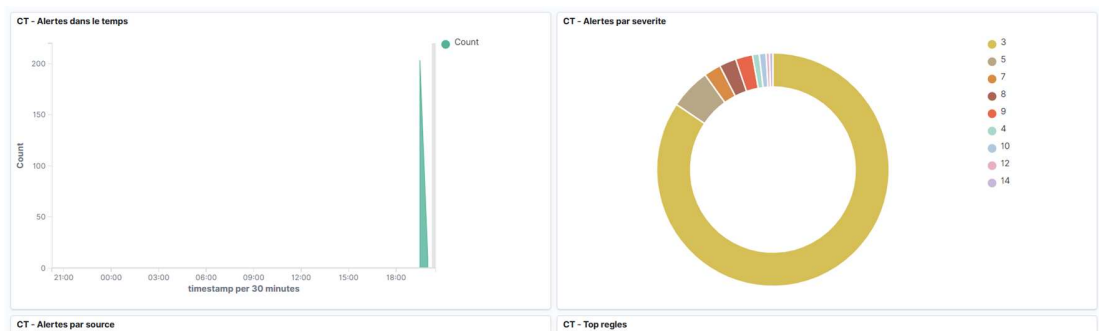

Le dashboard exécutif, destiné à Daylight, offre une lecture synthétique pour piloter le service (volume d'alertes, alertes critiques, alertes patients, tendance).


Dashboard Exécutif :

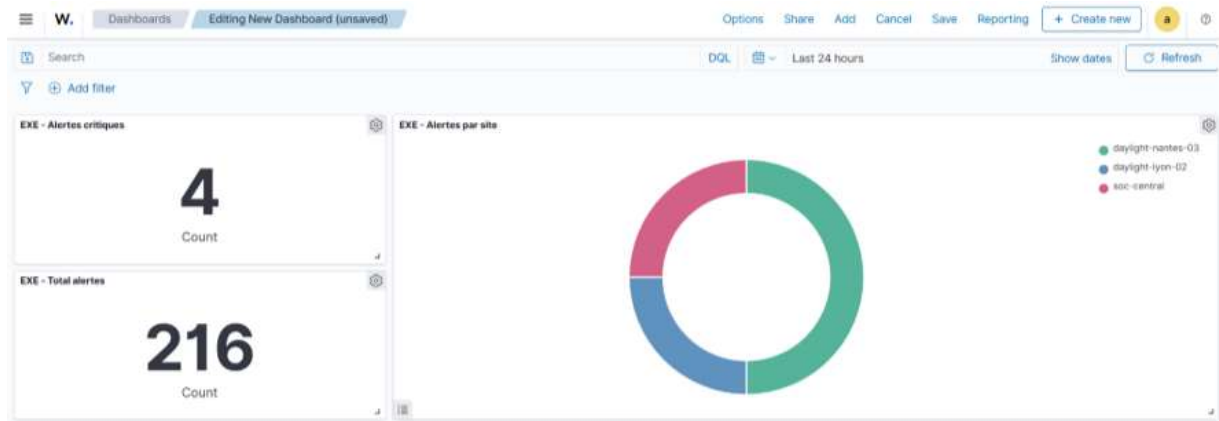

4.5. Pilotage de la vidéo et gestion des risques


J'ai piloté la préparation de la vidéo de démonstration : script, minutage, déroulé par intervenant et cohérence d'ensemble. Le montage final a été réalisé sous Canva (assemblage des séquences, transitions, rythme), tandis que les overlays affichant le nom et le rôle de chaque intervenant ont été préparés séparément à partir de nos propres supports.

Editeur Canva:

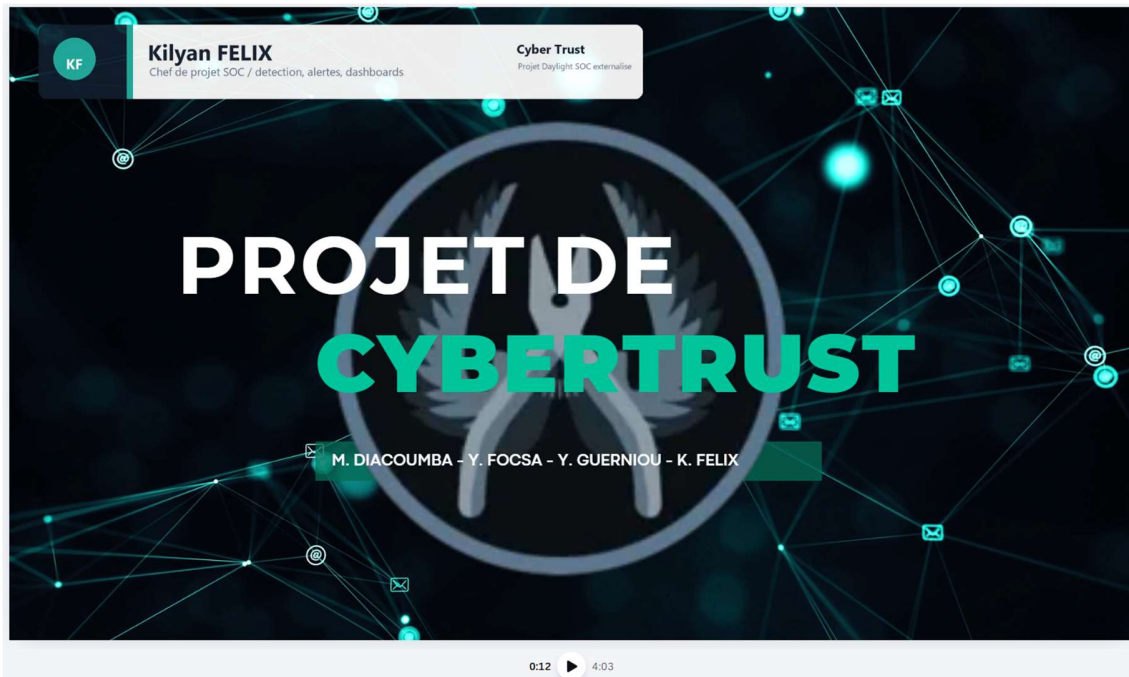

Afin que la vidéo ne soit pas perçue comme une présentation anonyme et que la contribution de chacun soit identifiable, j'ai mis en place un système d'overlays (bandeaux)

Exemple d'Overlay:



À chaque prise de parole, un encart s'affiche en bas de l'écran avec le nom et le rôle de l'intervenant. J'ai préparé un overlay par membre, en respectant une charte visuelle commune, puis calé leur apparition sur le déroulé de la vidéo. Cette mise en forme permet au jury de suivre facilement qui parle et de rattacher chaque partie à son auteur, ce qui répond à l'exigence de contribution individuelle visible.

Déroulé de la vidéo :

Étape	Intervenant	Durée	Visuel	Message clé
Préparation	Équipe	Hors caméra	Schémas, pfSense, Wazuh	Préparer les outils
Introduction	Kilyan	1 min 30	Slide titre	Présenter le projet
Architecture	Yvan	4 min	Schéma, pfSense	Segmentation réseau
SIEM Wazuh	Youssef	4 min	Agents, Dashboards	Collecte et détection
Pilotage SOC	Kilyan	3 min	Alertes, Dashboards	Qualification des alertes
Exploitation	Mahamadou	2 min 30	Runbook, Playbooks	Solution documentée
Conclusion	Kilyan / Équipe	1 min	Schéma global	Bilan et perspectives

5. Analyse critique des limites techniques :

La partie détection et qualification que j'ai pilotée constitue un MVP : elle démontre un workflow complet et cohérent, mais reste volontairement limitée à un cadre de démonstration. Plusieurs limites techniques sont à assumer :

- Aucun outil ITSM n'est connecté : le suivi des incidents reste manuel ;
- Il n'y a pas de véritable SOAR : la réponse s'appuie sur des playbooks documentés mais non automatisés ;
- Les SLA de triage sont proposés mais n'ont pas été mesurés sur une production réelle ;
- Les dashboards ont été validés sur un volume limité, pas sur le trafic réel de trente sites ;
- La vidéo reste à enregistrer et publier pour clôturer le dernier test de recette.

Ces limites sont normales à ce stade et ne remettent pas en cause la valeur de la solution. L'objectif n'était pas de livrer un SOC en production, mais de prouver un fonctionnement clair, priorisé et prêt à être industrialisé.

6. Perspectives d'évolution :

Les limites identifiées dessinent directement la trajectoire d'évolution de la solution. Pour passer du démonstrateur à un service SOC opérationnel, plusieurs axes peuvent être engagés :

- **Industrialisation sur les trente sites** : déployer progressivement la collecte sur l'ensemble des points de vente, en s'appuyant sur la procédure d'onboarding, et valider les SLA sur du trafic réel.
- **Automatisation de la réponse (SOAR)** : transformer les playbooks en réponses semi-automatisées (isolement d'un poste, blocage d'un compte, notification), pour réduire le délai de traitement.
- **Intégration à un outil ITSM** : connecter le SOC à une chaîne de ticketing pour le suivi et la traçabilité des incidents de bout en bout.
- **Enrichissement de la détection** : ajouter une sonde réseau (Suricata) puis une brique EDR, pour élargir la couverture.
- **Mesure et amélioration continue** : exploiter les KPI pour ajuster les règles et faire monter le SOC en maturité.

Ces évolutions permettraient à Cyber Trust de proposer à Daylight un service SOC complet, mesurable et réellement piloté dans la durée.

7. Conclusion :

En tant que chef de projet, ma contribution a donné au projet sa lisibilité opérationnelle. Au-delà du déploiement technique assuré par l'équipe, mon rôle a été de transformer un ensemble d'alertes en un service compréhensible et exploitable : scénarios priorisés, criticité définie, dashboards adaptés à chaque public, SLA, qualification et reporting.

Le résultat répond à l'enjeu initial de Daylight : ne pas avoir à lire des logs bruts, mais disposer d'une vision claire de ce qui est important, de qui agit et dans quel délai. La solution ne se contente pas de détecter des événements : l'équipe sait quoi en faire, et peut le démontrer preuve à l'appui.

Ce projet constitue un MVP solide, cohérent et prêt à être industrialisé, qui pose les bases d'un véritable service SOC pour Cyber Trust.

Annexe A : Documentation utilisateur :

Procédure d'exploitation du SOC – Wazuh

Objectif

Cette procédure décrit le fonctionnement courant du SOC, depuis la détection d'une alerte jusqu'à sa clôture par un analyste.

1. Accès

Se connecter au dashboard Wazuh selon son profil (administrateur, analyste ou supervision). Les profils analyste et supervision disposent d'un accès en lecture seule.

2. Lecture des alertes

Consulter les alertes classées par sévérité, source et règle. Les alertes critiques (niveau ≥ 12) sont traitées en priorité.

3. Qualification

Identifier le contexte (utilisateur, poste, serveur, site, application), vérifier les preuves et utiliser la matrice de criticité pour définir le niveau et le délai de traitement.

4. Réponse

Appliquer le playbook adapté puis qualifier l'événement : faux positif, incident confirmé, surveillance ou escalade.

5. Documentation

Enregistrer les actions réalisées et les preuves collectées. Pour tout incident critique, rédiger un retour d'expérience (REX) précisant la cause, la correction et les mesures de prévention.

6. Pilotage client

Le dashboard exécutif fournit une vue synthétique destinée à Daylight : volume d'alertes, alertes critiques, tendances et répartition par site.

Annexe B : Analyse personnelle :

Réflexion sur les défis rencontrés

Le principal défi a été de garder le projet lisible et piloté malgré sa dimension technique. Avec un SIEM capable de générer un grand volume d'événements, le risque permanent était de se perdre dans la technique et de produire une démonstration spectaculaire mais sans logique opérationnelle. Coordonner quatre périmètres (architecture, SIEM, exploitation, pilotage) tout en garantissant que chaque livrable soit prouvé a demandé une organisation rigoureuse.

Identification des forces et faiblesses personnelles

Ma principale force a été la capacité à faire le lien entre la technique et la décision : prioriser, expliquer et rendre une alerte exploitable pour un client. J'ai aussi su structurer le projet (backlog, recette, preuves) et coordonner l'équipe. Ma principale faiblesse a été de devoir résister à la tentation de m'investir dans la production technique des autres, alors que mon rôle était de cadrer et de consolider ; apprendre à déléguer et à rester sur mon périmètre a été un point de vigilance.

Compétences développées

- La traduction d'alertes techniques en criticité métier ;
- La conception de tableaux de bord différenciés selon le public (analyste vs client) ;
- Le pilotage de projet par les preuves (backlog, plan de recette, matrice exigences) ;
- La préparation et la coordination d'une démonstration fluide et cohérente.

Axes d'amélioration personnels pour de futurs projets

Pour mes prochains projets, je souhaite renforcer ma rigueur dans la délégation et le suivi des contributions de chacun, plutôt que de chercher à intervenir sur tous les volets. Je veux également approfondir le volet automatisation (SOAR, ITSM), que j'ai dû laisser à l'état de perspective faute de temps, afin de piloter un SOC non seulement organisé mais aussi automatisé.
